

# Jalasjärven koulukeskus

## SÄH valvontaraportti 14

Sähkötekniset työt 22.08.-02.09.2022

|         |             |            |                         |
|---------|-------------|------------|-------------------------|
| Valvoja | Antti Rinne | Sähköposti | antti.rinne@granlund.fi |
| Viikko  | 34-35       | Puhelin    | 050 315 2736            |
| Vuosi   | 2022        |            |                         |


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Työmaakäynnit. pvm             | - 24.08.2022<br>- 01.09.2022   |
| Urakoitsijapalaverit           | - 24.08.2022<br>-  |
| Suunnittelukokoukset           | -<br>-   |
| Muut kokoukset                 | - 24.08.2022 käyttäjäpalaveri kameravalvonnasta<br>- 31.08.2022 suunnitelmakatselmus sähkösuunnittelijan ja -urakoitsijan kanssa<br>-  |
| Työmaatilanne SU               | - Paikallavaluseinien putkitukset tehty B ja C talot<br>- Räystäslämmitysten sulanapitokaapelointi<br>- Pihan putkitukset (70 %) ja kaapelointi (55 %) meneillään<br>- Saneerauspuolen purut<br>- Syöttökaapelit C ja B taloon vedetty<br>- Eletelin kanssa syöttökaapelien käynti tulossa joku lauantai |
| Työturvallisuus                | -  |
| Kosteuden ja puhtaudenhallinta | -  |
| Aikataulutilanne               | - Sähkötyöt etenevät aikataulussa ja myönteisten rakennustöiden aikatauluja.<br>-<br>-   |
| Työmaakokousasiat              | - Työmaakokous 07 pidetty 10.08.2022   |
| Hyväksynyt                     | -<br>-   |

|  |  |
|--|--|
| Lisä ja muutostyöt                         | -  |
| Suunnitelmatilanne                         | -<br>-   |
| KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkastusmuistio on lähetetty projektipankissa 22.08.2022 mennessä olleisiin suunnitelmiin</li> <li>-</li> <li>- Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista</li> </ul>   |
| Tarkastukset ja huomautukset               | -  |
| Mallityöt ja malliasennukset               | -  |
| Laatuasiat                                 | -  |
| Viranomaisasiat                            | - Paloilmoittimen elinkaarikirja on laadittu   |
| Muut asiat                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukion parkissa tehdään ilmeisesti massanvaihto joka tapauksessa, joten tolpat voi siirtää asemakuvan mukaisesti huomioiden parkkiruutujaon. Tolppia on nykyisin 10 kpl jaettuna kahdelle sivulle (5+5)</li> <li>- <b>Sähkövalvoja on lomalla Lapissa viikon 37</b></li> <li>-</li> <li>- Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa</li> </ul> |

24.08.2022



E-osa telejakamotilan läpiviennit

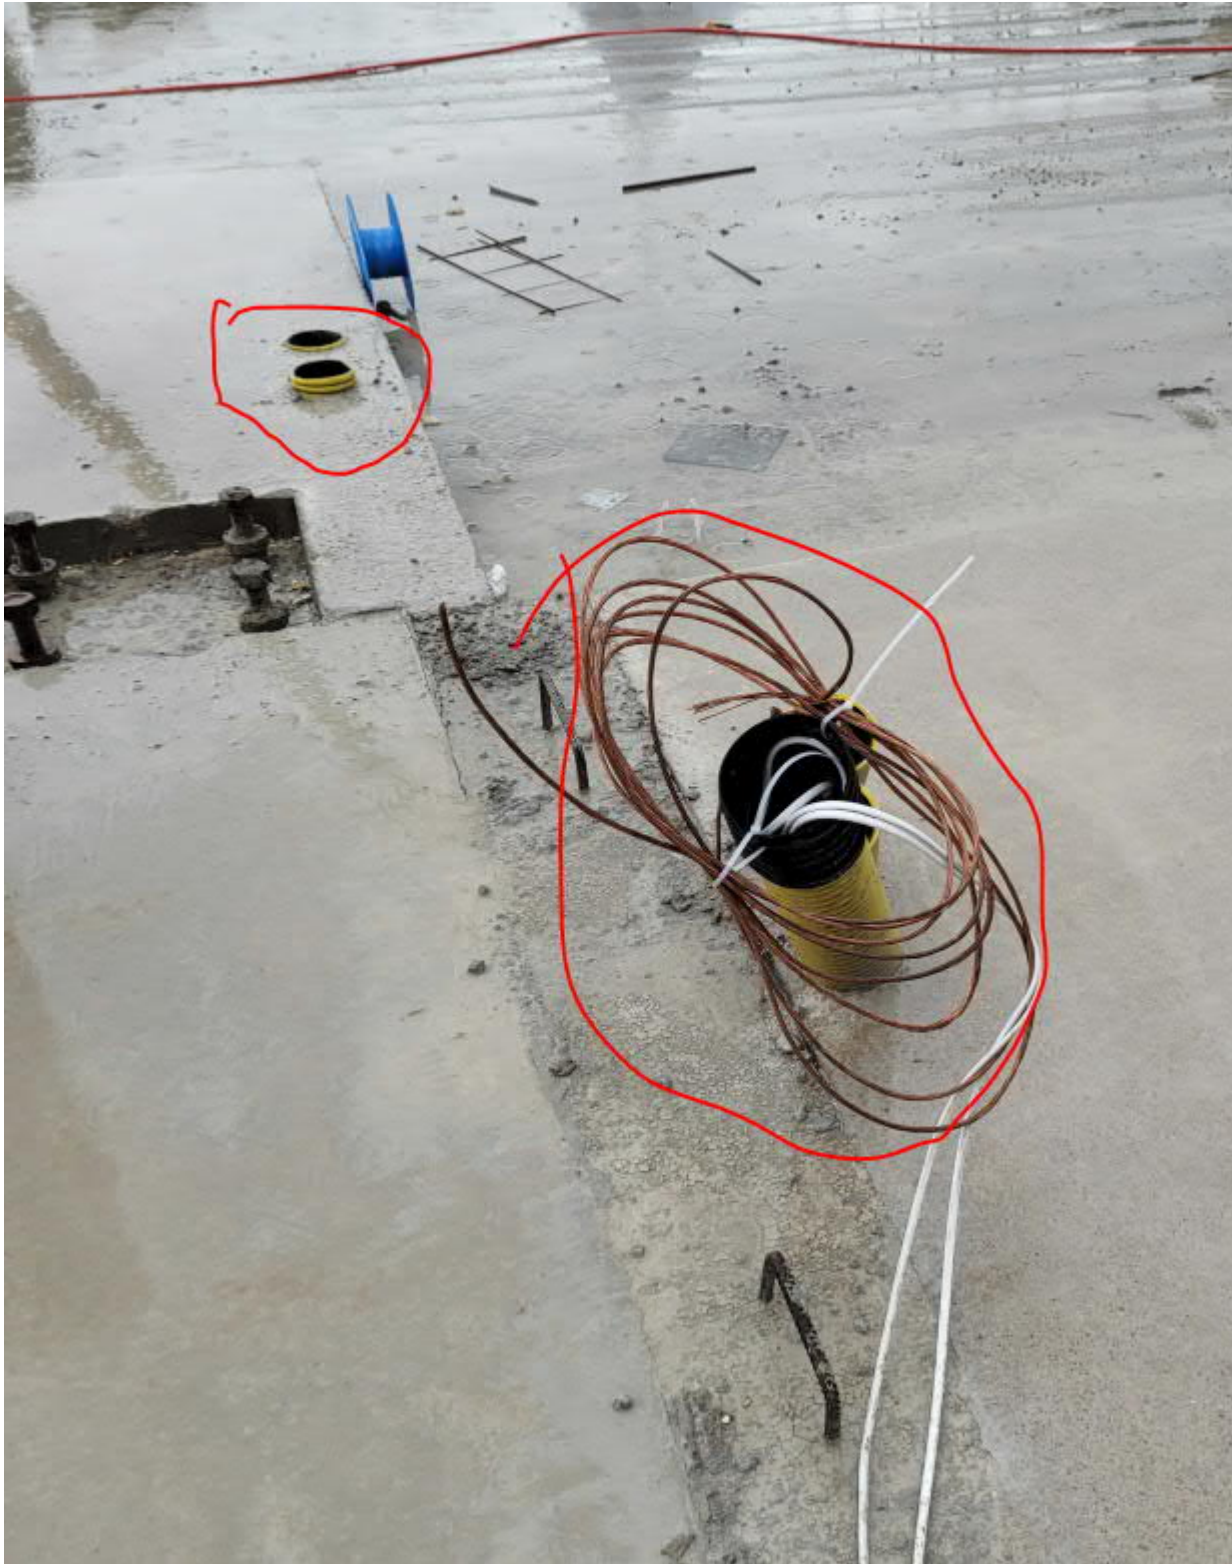

E-osa JK-E12 tilan läpiviennit ja taaempänä AV-tilan läpiviennit





E-osalla yhden sisäänkäynnin sulanapidon putkitusvaraus



sisäpiha on peitetty





AV-kaapeloinnin putkituksia C-osalla



01.09.2022



Valaisinkaapeloinnit pitkälti tehty. Kuvassa näkyy myös väliaikaisytön ventti









Sähkön putkivarauksia C-osan seinässä



Työmaalla on hyvät sakset



Näköala tulevasta opettajien työtilasta





C-osan. 2. kerroksessa väliseinätyöt vauhdissa.
