

# Jalasjärven koulukeskus Kurikka

## LVIA valvontaraportti vk28/2022

LVIA-tekniset työt 12.7.2022

Valvoja	Hannu Repola	050 315 2676	hannu.repola@granlund.fi
Viikko	28		
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 12.7.2022
Urakoitsijapalaverit	- 29.6.2022 Urakoitsijapalaveri (Valvoja ei osallistunut)
Suunnittelukokoukset	- Ei valvontajaksolla
Työmaatilanne ja työturvallisuus	<p>12.7.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Työmaakierros suoritettu.</li> <li>○ Yläasteen ja kädentaitojen rungot nousevat. LVI-tekniikan reikiä välipohjissa asianmukaisesti peitetynä ja merkattuna.</li> <li>○ Kaukolämpö- ja viemärikaivantoja piha-alueella.</li> <li>○ Alapohjien tuuletuskanavistoja asennettuna</li> <li>○ Liikuntahallin VSS-tilan lattiat valettu. Viemärit ja lattialämmityspotket valussa.</li> </ul> <p>Ei turvallisuusasioissa kirjattavaa</p>
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	- Ei huomautuksia
Aikataulutilanne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yleisaikataulun mukaan LVIA-töihin ei huomioita</li> <li>- LVI-suunnitelmia projektipankissa tällä hetkellä tarvittavin osin.</li> </ul>

Työmaakokousasiat	
Lisä ja muutostyöt	
Suunnitelmatilanne	<p>Projektipankissa suunnitelmat toteutussuunnittelu-kansiossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV D, 7.7.2022</li> <li>- RAU, 8.7.2022</li> <li>- LV F, 28.6.2022 (Rakennus B)</li> <li>- LV H, 22.6.2022 (Rakennus C)</li> <li>- LV F, 29.6.2022 (Rakennus E)</li> </ul>
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LVI valvonta laatinut suunnitelmatarkastuksista raportit viimeksi 21.6.2022 -&gt; osa kuvaista päivittynyt ja hyväksytty tämän jälkeen.</li> </ul>
Tarkastukset ja huomautukset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12.7.2022 Työmaakäynti</li> <li>- Kuvia käynneiltä raportin lopussa huomioiden kera.</li> </ul>
Mallityöt ja malliasennukset	
Laatuasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yläasteen KL-kaivantoon asennettu KL-putket ja voidaan peittää, kun työmaalle ajankohtaista.</li> </ul>
Viranomaisasiat	
Muut asiat	



Kuva 1. Yläaste, yleisnäkymä.



Kuva 2. Yläasteen välipohjissa LVI-varauksia.




Kuva 3. Yläasteen alapohjan kanava-asennuksia. Kanavat tulpattuna.





Kuva 4. Yläasteen KL-putkea kaivannossa.

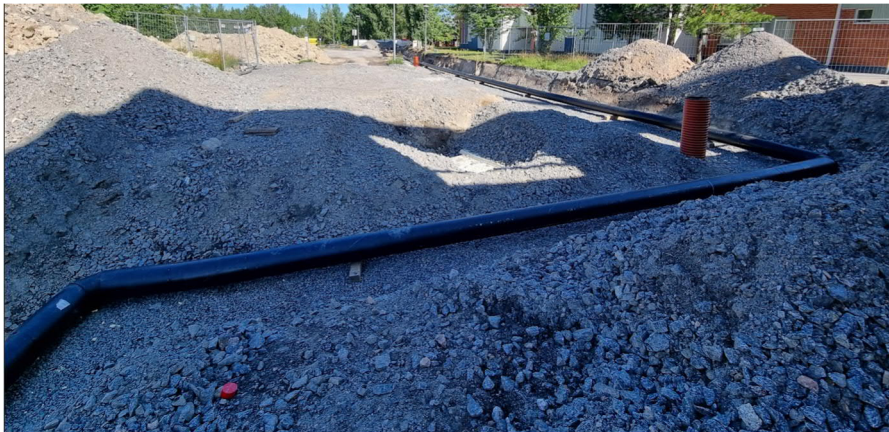

Kuva 5. Yläasteen KL-putkea kaivannossa.



Kuva 6. Kädentaidot, yleisnäkymä.

**GRANLUND POHJANMAA OY**  
TIEDEKATU 2  
60320 SEINÄJOKI

**PUHELIN 010 759 2800**  
**WWW.GRANLUND.FI**  
**ETUNIMI.SUKUNIMI@GRANLUND.FI**

**Y-TUNNUS 0764555-7**  
**KOTIPAikka VAASA**





Kuva 7. Liikuntahallin VSS-tilan viemärit toteutettu valuraudalla VSS-kaivolta eteenpäin.



Kuva 8. Liikuntahallin VSS-tilan lattia valettu. Viemärit ja lattialämmitysputket asennettu.



Kuva 9. Kädentaitojen viemärit asennuskaivanto.
